AgroRiego — Burndown chart

Oct 29, 2026 · @Julian

Métodos Ágiles de Desarrollo · Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez · Equipo 3

Cómo se registra

Cada sprint debe bajar de su total de puntos de historia a 0 en su último día hábil: Sprint 1 de 11 SP, Sprint 2 de 21 SP y Sprint 3 de 16 SP. El Scrum Master anota al cierre de cada día los SP que faltan.


- **SP ideales restantes:** el total del sprint repartido en partes iguales entre sus días hábiles. Ya están calculados en cada tabla.
- **SP reales restantes:** el total del sprint menos los puntos de las historias en «Hecho», es decir, aceptadas por el Product Owner. Una historia a medias no descuenta puntos.
- **Cómo leerlo:** si la línea real queda arriba de la ideal, el equipo va atrasado y se discute en la junta diaria; si queda abajo, va adelantado.

Este documento es el burndown oficial del equipo; su PDF se actualiza en el repositorio de GitHub y sirve como evidencia para el informe de cada sprint.

Gráfica

Cada sprint debe llegar a 0 SP en su último día hábil

SP restantes al cierre de cada día. Punteada: ritmo ideal. Azul: avance real, se agrega con la tabla de cada sprint.

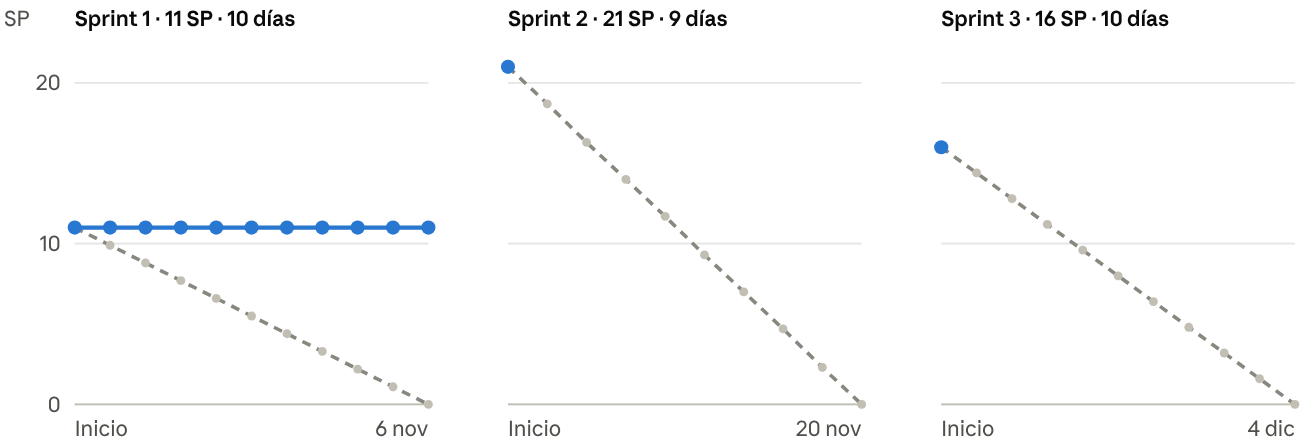

El Sprint 2 tiene 9 días hábiles porque el 16 de noviembre es asueto.

Ideal calculado del Product Backlog (11, 21 y 16 SP) · real: se registra al cierre de cada día

El Sprint 1 cerró el 6 de noviembre con 11 SP sin quemar: el código de las 3 historias estaba listo y probado desde el 1 de noviembre, pero ninguna cumplía la Definición de Terminado porque faltaban la revisión del pull request y el despliegue en AWS. La línea azul se completa con los SP reales de las tablas.

Sprint 1 · 26 oct – 6 nov 2026 · 11 SP

Día	Cierre del día	SP ideales restantes	SP reales restantes	Historias terminadas / notas
0	Inicio del sprint	11.0	11	Planeación del sprint
1	Lun 26 oct	9.9	11	
2	Mar 27 oct	8.8	11	
3	Mié 28 oct	7.7	11	
4	Jue 29 oct	6.6	11	
5	Vie 30 oct	5.5	11	Ninguna historia terminada; el código arranca la semana 2. Riesgo de atraso: se revisa en la junta del lunes 2.
6	Lun 2 nov	4.4	11	Código de las 3 historias en la rama sprint-1 con pruebas en verde (desde el 1 nov); falta PR revisado y despliegue
7	Mar 3 nov	3.3	11	
8	Mié 4 nov	2.2	11	
9	Jue 5 nov	1.1	11	
10	Vie 6 nov	0.0	11	Cierre del sprint: ninguna historia cumple la DoD (PR sin aprobar, sin despliegue en AWS)

Sprint 2 · 9 – 20 nov 2026 · 21 SP

El lunes 16 de noviembre es asueto, así que el ideal se reparte en 9 días hábiles.

Día	Cierre del día	SP ideales restantes	SP reales restantes	Historias terminadas / notas
0	Inicio del sprint	21.0	21	Planeación del sprint
1	Lun 9 nov	18.7		
2	Mar 10 nov	16.3		
3	Mié 11 nov	14.0		
4	Jue 12 nov	11.7		
5	Vie 13 nov	9.3		
6	Mar 17 nov	7.0		
7	Mié 18 nov	4.7		
8	Jue 19 nov	2.3		
9	Vie 20 nov	0.0		

Sprint 3 · 23 nov – 4 dic 2026 · 16 SP

Día	Cierre del día	SP ideales restantes	SP reales restantes	Historias terminadas / notas
0	Inicio del sprint	16.0	16	Planeación del sprint
1	Lun 23 nov	14.4		
2	Mar 24 nov	12.8		
3	Mié 25 nov	11.2		
4	Jue 26 nov	9.6		
5	Vie 27 nov	8.0		

Día	Cierre del día	SP ideales restantes	SP reales restantes	Historias terminadas / notas
6	Lun 30 nov	6.4		
7	Mar 1 dic	4.8		
8	Mié 2 dic	3.2		
9	Jue 3 dic	1.6		
10	Vie 4 dic	0.0		
